

**RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO “SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE
AGOSTO – PLAN PILOTO”.**

**DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
RUBROS AMBIENTALES**

PLANILLA 2

**PERÍODO: DESDE EL 29 DE MAYO HASTA
EL 27 DE JUNIO DEL 2026.**

ANTECEDENTES. -

El Ministerio del Ambiente y Agua, a través de la Dirección Zonal, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confirió los tres Registro Ambiental, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto, obra o actividad en las fases establecidas como se muestra en la siguiente tabla.

PROYECTO	RESOLUCION	CODIGO CIU
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BÚA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2020-030,	código CIU F4210.11
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI GRANDE (DIABLO)	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-099	código CIU F4210.32.01
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-098	código CIU F4210.32.01

Los Registros Ambientales en mención en la tabla anterior faculta la ejecución del proyecto/obra/actividad, cumpliendo con la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez exclusivamente para la actividad seleccionada por el operador en el catálogo de actividades establecido en el SUIA.

La contratista SUNTRAC S.A. a través del departamento de Seguridad y Ambiente realiza el reporte ambiental del seguimiento en la planilla 03 correspondiente al periodo desde el 28 de junio hasta el 27 de julio 2026.

UBICACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERISTICA DEL PROYECTO

El proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo.

La Características del proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", inicia en la parroquia de San Jacinto del Bua hasta la Parroquia Plan Piloto y tiene las siguientes características.


- Longitud de la vía: 9.5 kilómetros
- Ancho de cada carril: 3.00 metros
- Número de carriles: 2 unidades
- Ancho de espaldón: 0.60 metros

- Número de espaldones: 2 unidades

Sitio	Latitud (m)	Longitud (m)	Elevación (m.s.n.m.)
San Jacinto de Búa (0+000)	9°984.040.03	678.712.86	243.191
Plan Piloto (9+500)	9°992.268.76	677.756.36	248.616

MAPA DE UBICACIÓN

Gráfico G-1.1

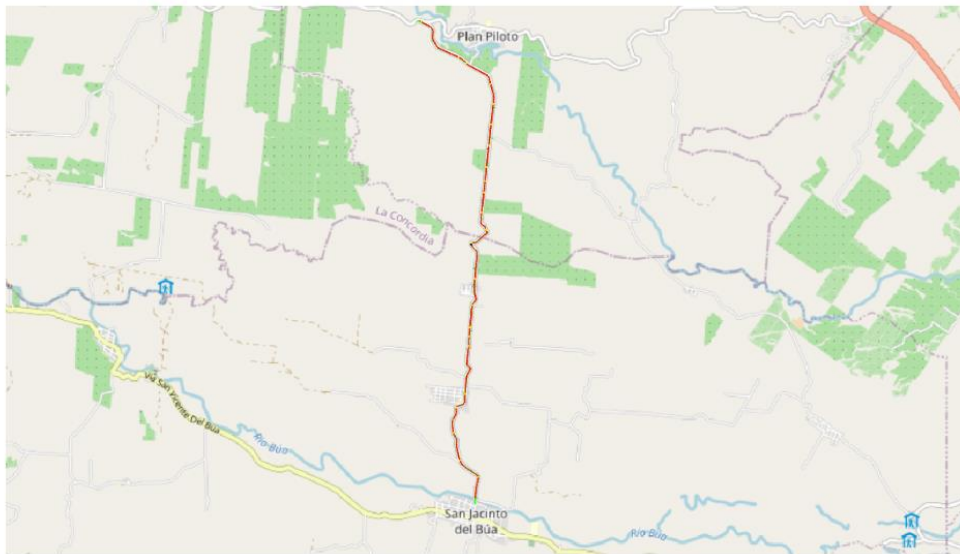

DESCRIPCIÓN DE RUBROS AMBIENTALES

Hasta el cierre de la Planilla 2 se han ejecutado los siguientes Rubros Ambientales contractuales:

RUBROS AMBIENTALES CONTRACTUALES:								
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA EN ESTE PERIODO	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA HASTA LA FECHA	OBSERVACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
7.1.	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	2500.00	290.00	300.00	590.00	En este segundo periodo correspondiente desde el 29 de mayo al 27 de junio del 2026, se realizó el riego de agua para control de polvo, en el centro en el tramo cercano donde se estuvo interviniendo con los trabajos constructivos; Además de los centros de acumulación de viviendas adjunto a la vía. Ver anexo 02. Registro fotográfico n° 03.	23.60%
7.2.	LETRERO AMBIENTAL / MEDIDAS AMBIENTALES 2.20X1.10 M	u	10.00	0.00	0.00	0.00	De acuerdo a la programación la colocación de letreros ambientales 2.2x 1.10m se lo realizará en el séptimo mes o periodo de trabajo, de acuerdo a la programación presentada.	0.00%
7.3.	TACHO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS Y/O DESECHOS	u	2.00	1.00	1.00	2.00	En este segundo periodo, se realizó la adquisición de un tanque metálico para la disposición temporal de los desechos sólidos. Ver Anexo 17.	100.00 %
7.4.	MONITOREO CALIDAD DEL AGUA	u	4.00	0.00	0.00	0.00	En este periodo no se realizó el monitoreo de la calidad del agua, ya que en la programación esta planificada para el siguiente periodo. Se adjunta la cotización para el análisis de la calidad del agua. Ver anexo 26.	0.00 %
7.5.	MONITOREOS DE RUIDO	u	2.00	0.00	0.00	0.00	En este periodo no se realizó el monitoreo de la calidad del agua, ya que en la programación está planificada para el siguiente periodo. Se adjunta la proforma para la medición de ruido ambiental. Ver anexo 26.	0.00%
7.6.	CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL	u	8.00	1.00	1.00	2.00	En este periodo se realizó la segunda charla a los trabajadores de acuerdo a lo estipulado en programación del contrato. Ver anexo 13.	25 %
7.7.	BATERIA SANITARIA MOVILES	u	2.00	1.00	0.00	1.00	En este periodo no se instaló la segunda batería Portátil por motivos que el personal obrero no pasó las 25 personas diarias en campo. De acuerdo a los planificado	50. %
							en los siguientes periodos cuando se incrementará personal en los frentes construcción de cunetas y bordillos allí se lo realizará.	
7.8.	CHARLA AMBIENTALES A LA COMUNIDAD	u	8.00	0.00	1.00	1.00	La charla se la realizó el 04 de junio del presente año. Ver anexo 21. Informe de Charlas	12.5 %
7.9.	AREAS SEMBRADAS	M2	1000.00	0.00	0.00	0.00	Al término del último periodo o mes de trabajo, se realizará la siembra de vegetación.	0.00 %

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- AGUA PARA CONTROL DE POLVO



- ÁREA DE RESIDUOS



- **CHARLA AMBIENTAL**



- **CHARLA A LA COMUNIDAD**

