

**RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO “SAN JACINTO DE BÚA – 10 DE
AGOSTO – PLAN PILOTO”.**

**DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
RUBROS AMBIENTALES**

**PLANILLA Nro. 04 DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL Y PLANILLA Nro
2 DE ORDEN DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO:
DESDE
28 DE JULIO HASTA EL 26 DE AGOSTO
DEL 2026**

ANTECEDENTES. -

El Ministerio del Ambiente y Agua, a través de la Dirección Zonal, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confirió los tres Registro Ambiental, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto, obra o actividad en las fases establecidas como se muestra en la siguiente tabla.

PROYECTO	RESOLUCION	CODIGO CIU
RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "SAN JACINTO DE BÚA - 10 DE AGOSTO - PLAN PILOTO	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2020-030,	código CIU F4210.11
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI GRANDE (DIABLO)	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-099	código CIU F4210.32.01
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OMPI	MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-098	código CIU F4210.32.01

Los Registros Ambientales en mención en la tabla anterior faculta la ejecución del proyecto/obra/actividad, cumpliendo con la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez exclusivamente para la actividad seleccionada por el operador en el catálogo de actividades establecido en el SUIA.

La contratista SUNTRAC S.A. a través del departamento de Seguridad y Ambiente realiza el reporte ambiental del seguimiento en la planilla Nro. 04 de cumplimiento ambiental y planilla Nro 2 de orden de trabajo correspondiente al periodo: desde 28 de julio hasta el 26 de agosto del 2026.

UBICACIÓN DEL PROYECTO Y CARACTERISTICA DEL PROYECTO

El proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo.

La Características del proyecto "Rectificación y mejoramiento del camino "San Jacinto de Bua – 10 de Agosto – Plan Piloto", inicia en la parroquia de San Jacinto del Bua hasta la Parroquia Plan Piloto y tiene las siguientes características.


- Longitud de la vía: 9.5 kilómetros
- Ancho de cada carril: 3.00 metros
- Número de carriles: 2 unidades
- Ancho de espaldón: 0.60 metros

- Número de espaldones: 2 unidades

Sitio	Latitud (m)	Longitud (m)	Elevación (m.s.n.m.)
San Jacinto de Búa (0+000)	9°984.040.03	678.712.86	243.191
Plan Piloto (9+500)	9°992.268.76	677.756.36	248.616

MAPA DE UBICACIÓN

Gráfico G-1.1

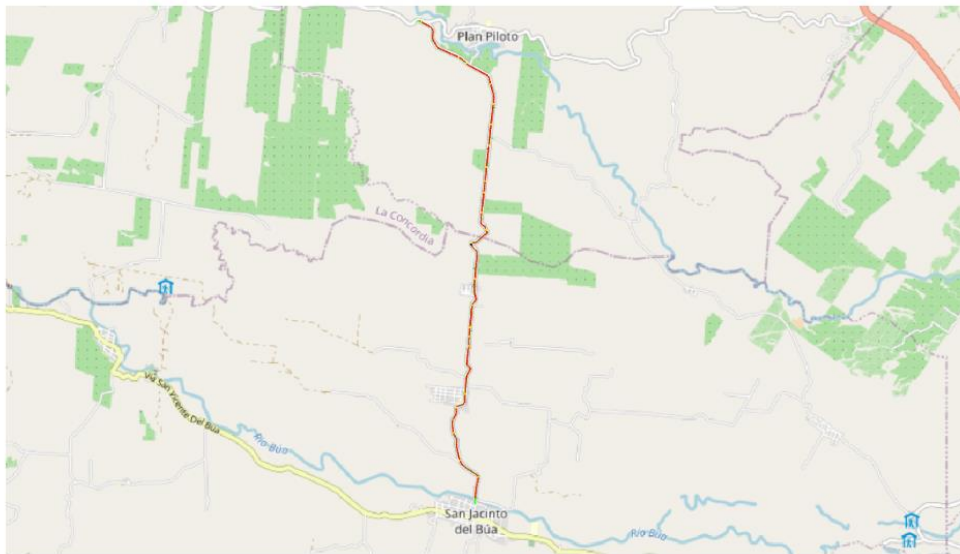

DESCRIPCIÓN DE RUBROS AMBIENTALES

Hasta el cierre de la Planilla se han ejecutado los siguientes Rubros Ambientales

contractuales:

RUBROS AMBIENTALES CONTRACTUALES:							
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN ESTE PERIODO	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA HASTA LA FECHA	OBSERVACION	PORCENTAJE DE AVANCE
7.1.	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	2500.00	300.00	1190.00	En este periodo de ejecución correspondiente desde el 28 de julio al 26 de agosto del 2026, se realizó el riego de agua para control de polvo, el tramo cercano donde se estuvo interviniendo con los trabajos constructivos; Además de los centros de acumulación de viviendas adjunto a la vía. Anexo 3.	47.6%
7.2.	LETRERO AMBIENTAL / MEDIDAS AMBIENTALES 2.20X1.10 M	u	10.00	0.00	0.00	En este Periodo de ejecución no está programado los letreros ambientales, están para	0.00%
						el séptimo periodo de Ejecución	
7.3.	TACHO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS Y/O DESECHOS	u	2.00	0.00	2.00	El cumplimiento de este rubro se ejecutó en los periodos anteriores y se adjuntó sus medios de verificación.	100. %
7.4.	MONITOREO CALIDAD DEL AGUA	u	4.00	2.00	2.00	Durante el cuarto periodo de evaluación, se dio cumplimiento parcial a la acción correctiva establecida en el Plan de Acción de Rubros Ambientales, relacionada con la ejecución del monitoreo de calidad del agua en el río OMPI. En fecha 21 de agosto de 2026 se realizaron dos (2) muestreos de calidad de agua conforme a los parámetros establecidos en el Plan de Acción, como parte del seguimiento de la calidad del recurso hídrico en el área de influencia del proyecto. Considerando que la programación contempla un total de cuatro (4) muestreos, los dos muestreos ejecutados durante el presente periodo representan un avance del 50 % respecto del total programado. Los dos (2) muestreos restantes se mantienen programados conforme al Plan de Acción para su ejecución posterior. Los resultados de los análisis y la documentación de respaldo correspondiente SON INCORPORADOS EN En consecuencia, durante el presente periodo se evidencia un avance en la ejecución de la acción correctiva, manteniéndose el seguimiento hasta completar la totalidad de los monitoreos establecidos. Ver Anexo 33, 34, 36,37 y 38	50.00%
7.5.	MONITOREOS DE RUIDO	u	2.00	1.00	1.00	Durante el cuarto periodo de evaluación, se dio seguimiento a la acción correctiva establecida en el Plan de Acción de Rubros Ambientales, relacionada con la ejecución del monitoreo de ruido ambiental correspondiente al rubro ambiental contractual. De acuerdo con el Plan de Acción presentado por la contratista Suntrac	50.00%

						S.A., se estableció la ejecución de monitoreos de ruido ambiental durante los meses de agosto y octubre de 2026, cuyos resultados deberán ser comparados con los límites máximos permisibles establecidos en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A, o la normativa ambiental que lo reemplace. Durante el presente periodo, en fecha 21 de agosto de 2026, se realizó un (1) monitoreo de ruido ambiental, correspondiente a uno de los dos muestreos programados. Por lo tanto, se registra un avance del 50 % respecto del total de muestreos establecidos en el Plan de Acción. El muestreo restante se mantiene programado para el mes de octubre de 2026, conforme a la planificación establecida. Una vez obtenidos los resultados correspondientes, estos serán analizados y comparados con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental aplicable, incorporándose el respectivo informe como medio de verificación. En consecuencia, durante el presente periodo se evidencia un avance del 50 % en la ejecución de la acción correctiva, manteniéndose el seguimiento hasta completar la totalidad de los monitoreos programados. Ver Anexo 33, 34, 35, 36.	
7.6.	CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL	u	8.00	1.00	4.00	En este periodo se realizó una charla a los trabajadores. Ver Anexo 23.	50.00 %
7.7.	BATERIA SANITARIA MOVILES	u	2.00	1.00	2.00	Durante el cuarto periodo de evaluación, se verificó el cumplimiento de la acción correctiva establecida en el Plan de Acción de Rubros Ambientales, relacionada con la implementación de la segunda batería sanitaria móvil contemplada en el rubro contractual. De acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción presentado por la contratista Suntrac S.A., la instalación de la segunda batería sanitaria	100 %

						móvil se encontraba programada para el mes de agosto de 2026. Durante el presente periodo se verificó la implementación y disponibilidad de las dos (2) baterías sanitarias móviles requeridas para el proyecto, encontrándose habilitadas para el uso del personal. Con la implementación de la segunda unidad sanitaria se subsana la No Conformidad Menor (NC-) identificada en periodos anteriores, alcanzándose el 100 % de cumplimiento del rubro correspondiente a las baterías sanitarias móviles. Asimismo, se mantendrá el control de las condiciones de funcionamiento, limpieza de las unidades sanitarias durante los siguientes periodos, conforme a las obligaciones ambientales aplicables. Ver Anexo 8	
7.8.	CHARLA AMBIENTALES A LA COMUNIDAD	u	8.00	1.00	3.00	La charla se la realizó el 21 de agosto del presente año. Ver Anexo 30 y 31	37.5 %
7.9.	AREAS SEMBRADAS	M2	1000.00	0.00	0.00	Este Rubro se ejecutará en el último periodo de ejecución o mes de trabajo, se realizará la siembra de vegetación.	0.00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

- AGUA PARA CONTROL DE POLVO



- CHARLA AMBIENTAL



- CHARLA A LA COMUNIDAD



-



NO TIENE LOGO

SANRENT S.A.S.	
SANRENT S.A.S.	
Dirección Matriz:	Barrio: SANRENT GUATO Calle 103 No.3049B UBICACIÓN (City) numbers: S/N Intersección AMBULANAS DE 103 YD 103A/103B
Dirección Sucursal:	Barrío: SANRENT GUATO Calle 103 No.3049B UBICACIÓN (City) numbers: S/N Intersección AMBULANAS DE 103 YD 103A/103B

R.U.C.:	1793212933001
FACTURA	
No.	001-202-00000001
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
18000280117932129330012901802000000012951424411	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	04/05/2020 11:10:43
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	

Razón Social / Nombre y Apellido:		CÓDIGO DE BARRAS	
Identificación:	Fecha:	Plazo / Interés:	Guía
178388762001			
18082026			
Dirección: CUBACA 588 Y SALAMANCA			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precios en Subtotal	Descuento	Precio Total
88		1.00	BASIC PORTABLE		880.00	8.00	8.00	8.00	880.00
Información adicional:						SUBTOTAL 18%			
Email: ventas@baltazarraa@gmail.com						SUBTOTAL SIN DESCUOTO DE IVA			
Forma de pago:						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
Valor:						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
NO SE PUEDE DAR EL VALOR DEL IMPORTE PAGO/RECIBO						TOTAL DESCUENTO:			
						IVA			
						IVA 18%			
						EXENTO			
						EXENTOS			
						VALOR TOTAL			
						VALOR TOTAL SIN DESCUOTO			
						VALOR (POR SUBSIDIO)			
						(Indique P/R cuando corresponda)			

- Monitoreos.



Factura.



**DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE
PROYECTOS AMBIENTALES
DEMAPA CIA LTDA**

File Manager, Properties, Gallery

The Bharatnatya Founder, Pratibha, Centre

Telephone: (202) 241-2644

Chilguyev et al. / *Neural Correlates of* 49

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS LITERATURE, MANAGEMENT SCIENCE, AND ECONOMICS

Fractura

001 - 001 - 000002657

ENCLOSURE 1720 1000-4000

Notes on Contributors

来源: 2012年11月21日 来源: 中国石化网 2012年11月21日 14:14

Finalis y Honoris de Akademikan

2020-09-30 09:11:00

Parabola **PROBLEM 1000**

Keywords: *transformation, motivation, self-efficacy*

CLAVE DE ACCESO

B0000000



©2000 by J.B. STALLAC, S.A. TRANSCORPUS, INC. 1991

Ubicación: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / VALLE HERMOSO / VÍA GUINPEDE SAN Y MARGARITA DE LOS RÍOS

MULTI-LEVEL: THE NEW PRACTICE

THESE **THÈSE**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Email: coral@deductivetraining.com

Effect of the transformation: significant

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

DOI: 10.1002/for

Código	Cantidad	Descripción	Imp	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
12	1.000	Monitores subo clumo	*	50.0000	0.00	50.00
20	2.000	Monitores de agua	*	244.0000	0.00	488.00
31	1.000	Movilización	*	80.0000	0.00	80.00

		Subtotal:	710.00
		Subtotal 10%:	71.00
		I.V.A. 10%:	92.70
		Valor Total/USD:	710.70

Highman General

Desarrollado por  Pfraction
